

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☒ AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☐



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam:

BTW nr: 400 639 593

of identiteitskaartnr:

Stroomleverancier:

Meter nr: 47995408 stand:

Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr:

Lid nr: Ontvangstbewijs nr:

Installatie: Naam:

Adres: MEZENSTR/NBUEKENSTR 5
3061 LEEFDAL

Datum onderzoek: 22/01/03

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: KRIS VANDERLICK

Adres: MEZENSTR/NBUEKENSTR 5

Aanvrager: 3061 LEEFDAL

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI. art. ☐ 86 ☒ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 400V, AC, Bescherming aansluiting: A Type:

Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: EVAVB Doorsnede: 5 x 90mm²

Voeding hoofdbord: x mm Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 15 + 9

Type aardelektrode: lus Spreidingsweerstand: < 5 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2008 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)


De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.


Bijlagen:

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



KINDERDAG VERBLIJF

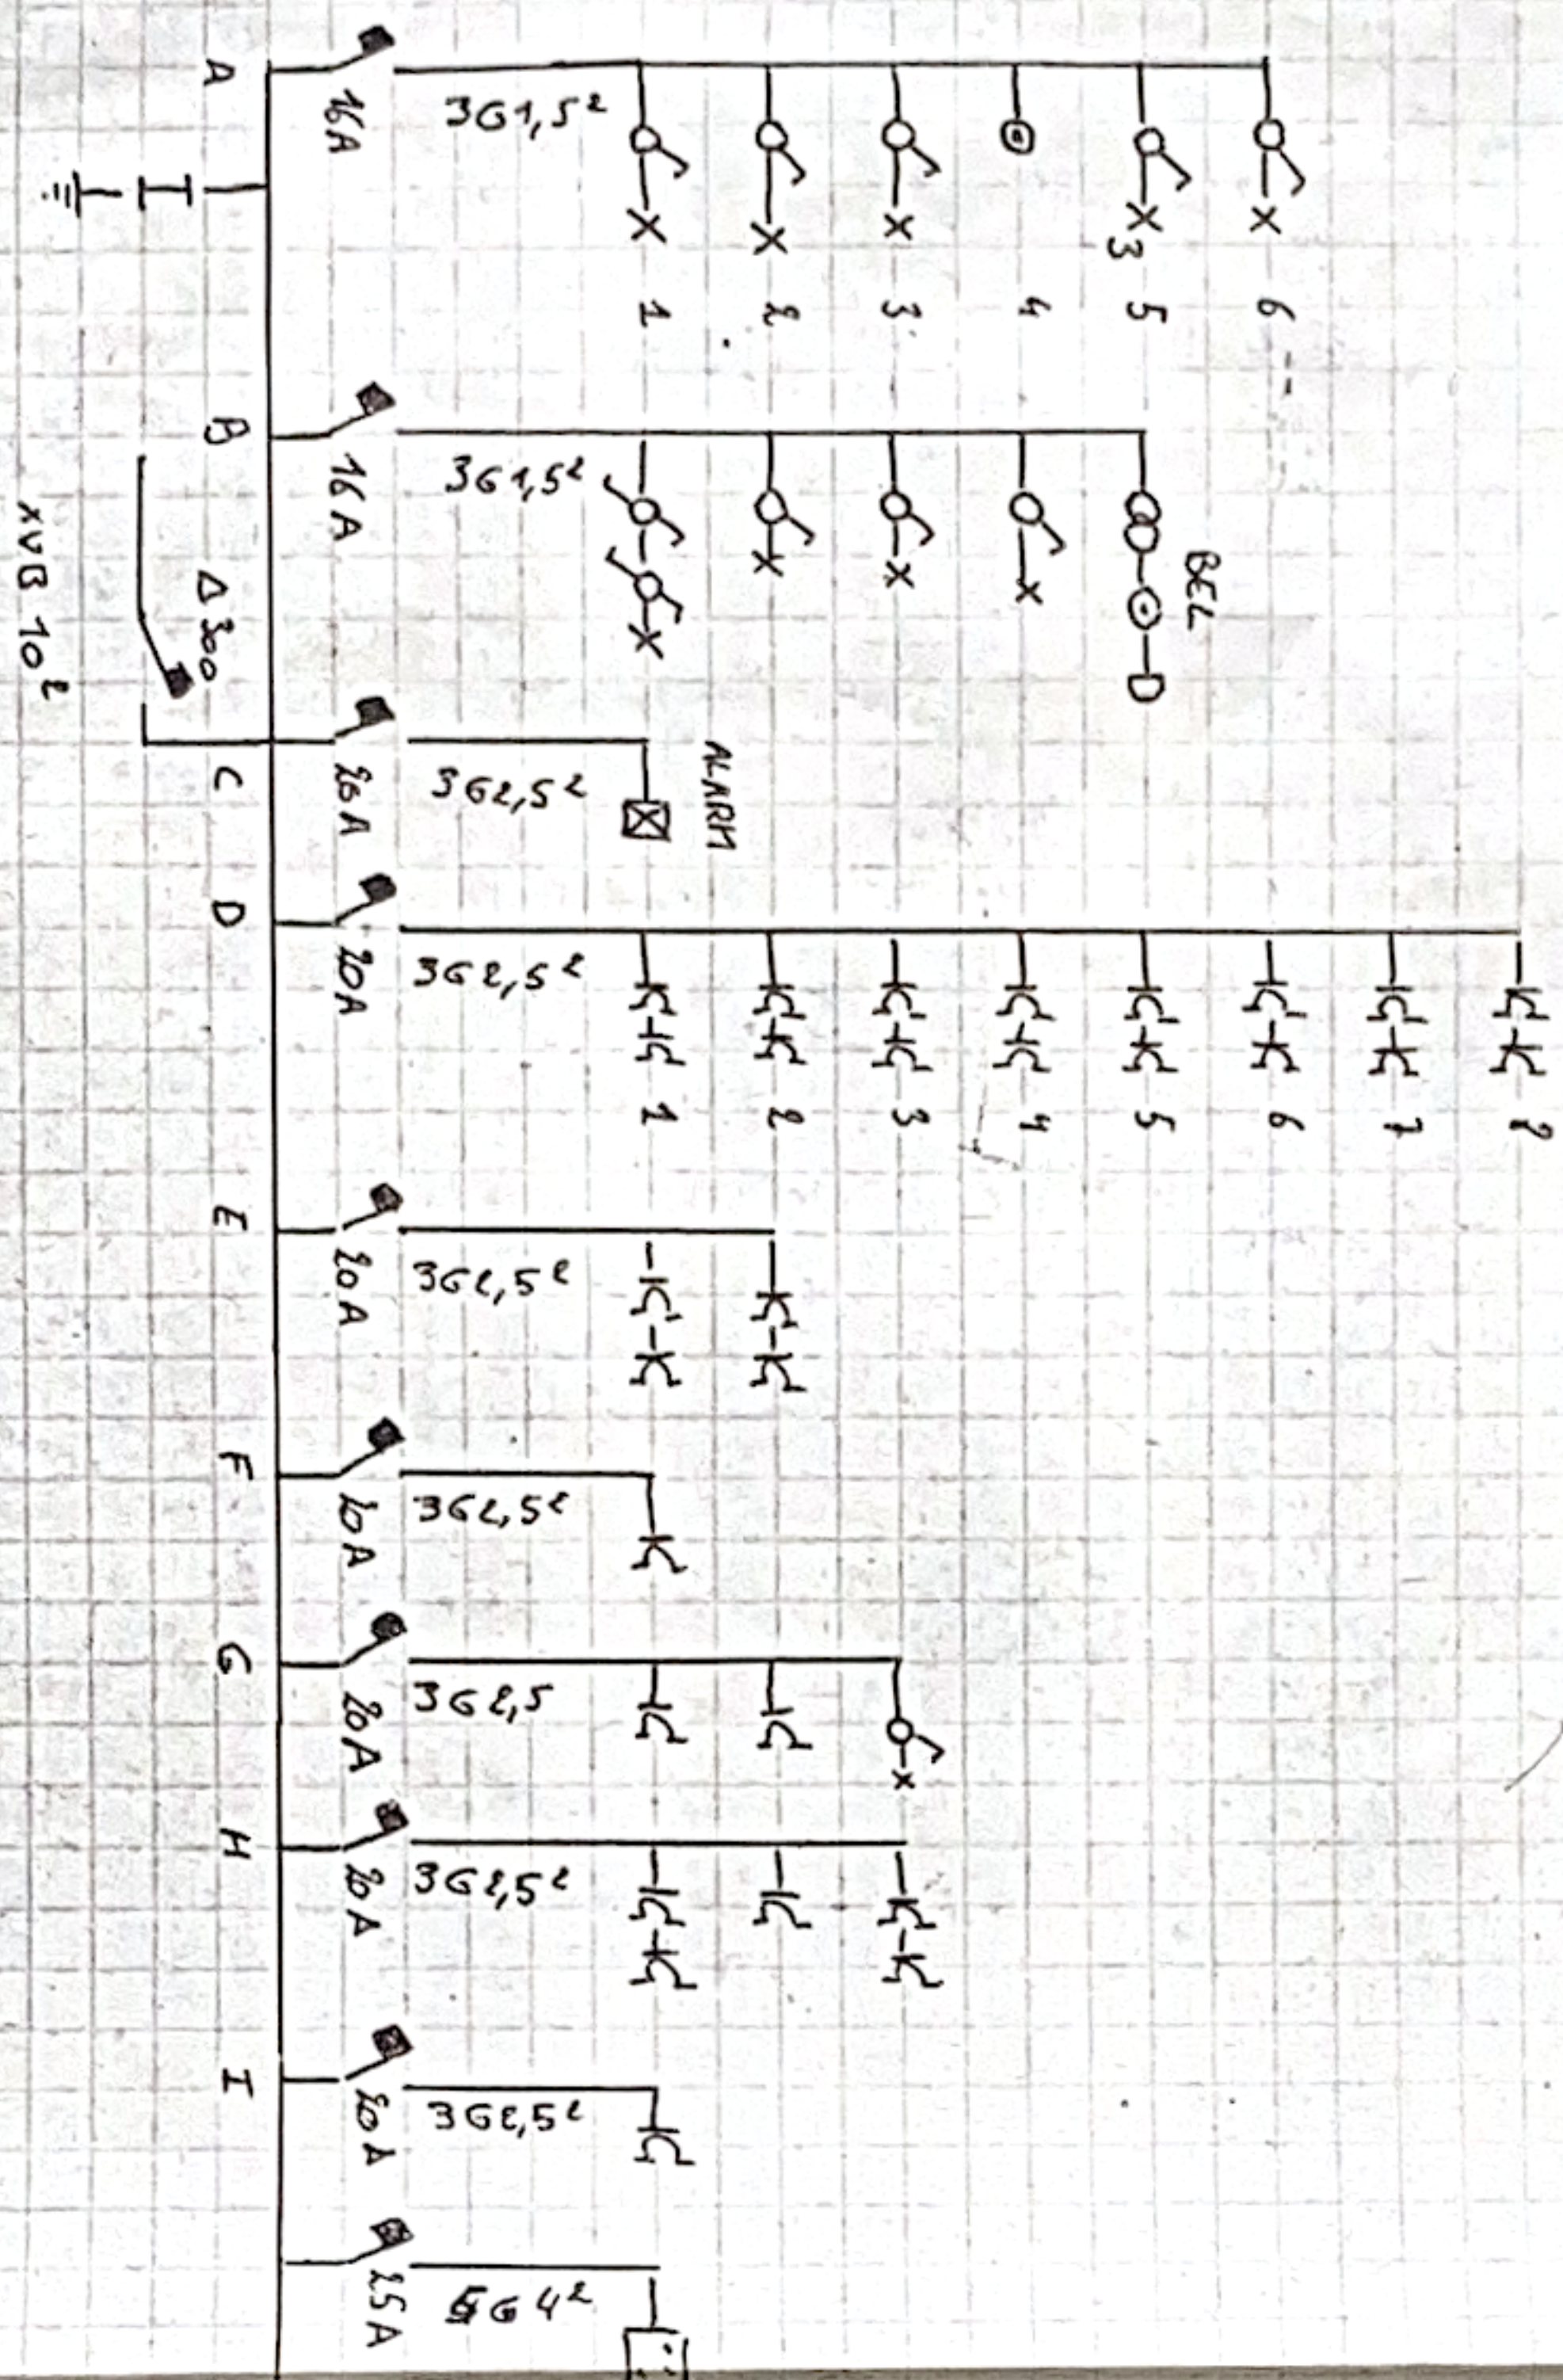

MEUWELI VAN LEEFDAL
HOEK HEZENSTRAAT VAN DEUKENHOUDST
3061 LEEFDAL
Kris Vanderlicke

[Signature]

